TRIAL MODE. Click here for more information

Identifikátor	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1		**15709-Nižná / Tr110/22kV -komplexná rekonštrukcia**	**323 dní**	**Po 2.11.26**	**Str 26.1.28**
2		Zahájenie projektu	0 dní	Po 2.11.26	Po 2.11.26
3		**0. Etapa - príprava**	**21 dní**	**Po 2.11.26**	**Po 30.11.26**
4		Zameranie staveniska a zariadenia staveniska	3 dní	Po 2.11.26	Str 4.11.26
5		Bezpečnostné oplotenie staveniska	2 dní	Št 5.11.26	Pi 6.11.26
6		**SO34 - BSP**	**10 dní**	**Po 2.11.26**	**Pi 13.11.26**
7		Vypratanie, vyčlenenie a dočasné oddelenie priestorov v BSP - miestnosť 1.05	10 dní	Po 2.11.26	Pi 13.11.26
8		**SO37 - Vonkajšie osvetlenie**	**10 dní**	**Št 5.11.26**	**Str 18.11.26**
9		Vybudovanie dotknutej časti VO	10 dní	Št 5.11.26	Str 18.11.26
10		**SO45 - Hrubá úprava terénu**	**15 dní**	**Št 5.11.26**	**Str 25.11.26**
11		HUT pre zariadenie staveniska	15 dní	Št 5.11.26	Str 25.11.26
12		**SO50 - HUS**	**10 dní**	**Po 9.11.26**	**Pi 20.11.26**
13		Vybudovanie časti uzemňovacej sústavy	10 dní	Po 9.11.26	Pi 20.11.26
14		**PS10 - R22kV**	**2 dni**	**Po 16.11.26**	**Ut 17.11.26**
15		Preloženie a Spojkovanie vedení V214 a V197	2 dni	Po 16.11.26	Ut 17.11.26
16		Preloženie a spojkovanie V1353	2 dni	Po 16.11.26	Ut 17.11.26
17		**PS50 - Vlastná spotreba**	**5 dní**	**Po 16.11.26**	**Pi 20.11.26**
18		Demontáž RU3, US, UG + kabeláž	5 dní	Po 16.11.26	Pi 20.11.26
19		Výstavba zariadenia staveniska	4 dní	Po 23.11.26	Št 26.11.26
20		Zhotovenie skladových priestorov	2 dní	Str 25.11.26	Št 26.11.26
21		Zhotovenie NN staveniskového rozvodu	3 dní	Str 25.11.26	Pi 27.11.26
22		Pripojenie staveniska na dočasnú prípojku vody	1 deň	Pi 27.11.26	Pi 27.11.26
23		ukončenie 0. etapy	1 deň	Po 30.11.26	Po 30.11.26
24		**1. Etapa - prepojenie VVN vedení - "T" prípojenie rozvodne**	**302 dní**	**Po 30.11.26**	**Str 26.1.28**
25		Zahájenie 1.etapy	0 dní	Po 30.11.26	Po 30.11.26
26		**SO34 - BSP**	**175 dní**	**Ut 1.12.26**	**Po 2.8.27**
27		Búracie práce	10 dní	Ut 1.12.26	Po 14.12.26
28		Budovanie nového KK (pod schodami a v chodbe)	25 dní	Ut 1.12.26	Po 4.1.27
29		ZTI konečná úprava dispozície	25 dní	Ut 15.12.26	Po 18.1.27
30		Odstránenie rozvádzačov v R22kV	30 dní	Ut 16.3.27	Po 26.4.27
31		Odľahčenie stropu	20 dní	Ut 27.4.27	Po 24.5.27
32		Zosilnenie stropu	20 dní	Ut 25.5.27	Po 21.6.27
33		Prepojenia z miestnosti 1.10 k TVS	20 dní	Ut 22.6.27	Po 19.7.27
34		odstránenie Dupronitových priečok	20 dní	Ut 27.4.27	Po 24.5.27
35		vybudovanie nových priečok	20 dní	Ut 25.5.27	Po 21.6.27
36		Rekonštrukcia transportného balkóna	50 dní	Ut 25.5.27	Po 2.8.27
37		Podopretie transportného koridoru	5 dní	Ut 9.3.27	Po 15.3.27
38		Navezenie rozvádzačov R22kV	5 dní	Ut 27.4.27	Po 3.5.27
39		**SO49 - Demolácie**	**30 dní**	**Št 25.3.27**	**Str 5.5.27**
40		Základové pätky	20 dní	Št 8.4.27	Str 5.5.27
41		KK	20 dní	Št 8.4.27	Str 5.5.27
42		Bezpečnostné zábradlia	20 dní	Št 8.4.27	Str 5.5.27
43		Betónové plochy	20 dní	Št 8.4.27	Str 5.5.27
44		Stanovište transformátora	20 dní	Št 25.3.27	Str 21.4.27
45		Stanovište tlmiviek	20 dní	Št 25.3.27	Str 21.4.27
46		Oplotenia , múry, brány vrátane základov	20 dní	Št 25.3.27	Str 21.4.27
47		Šachty, chodníky , obrubníky	20 dní	Št 25.3.27	Str 21.4.27
48		Demontáž lámp	20 dní	Št 25.3.27	Str 21.4.27
49		Asfaltové a betónové komunikácie + frézovanie	20 dní	Št 25.3.27	Str 21.4.27
50		Žumpa	10 dní	Št 25.3.27	Str 7.4.27
51		**PS04, PS06, PS09**	**292 dní**	**Ut 1.12.26**	**Str 12.1.28**
52		Výmena tlakovzdušného vypínača v poli AEA04	10 dní	Ut 1.12.26	Po 14.12.26
53		Kompletné vypnutie R110kV - napájanie cez VN V1353	0 dní	Po 14.12.26	Po 14.12.26
54		By-pass vedení V7211 a V7212	10 dní	Ut 15.12.26	Po 28.12.26
55		Oddelenie poli AEA01, AEA03 od AEA02, AEA04	10 dní	Ut 29.12.26	Po 11.1.27
56		Vybudovanie dočasného stanovišťa tlmivky L22 (L102)	30 dní	Ut 15.12.26	Po 25.1.27
57		Presun L22 na nové dočasné stanovište	10 dní	Ut 26.1.27	Po 8.2.27
58		Skúšky L22	2 dni	Ut 9.2.27	Str 10.2.27
59		Prevádzka R110kV cez polia AEA02, AEA04	0 dní	Str 10.2.27	Str 10.2.27
60		demontáž technológie v poli AEA01, AEA03	40 dní	Št 11.2.27	Str 7.4.27
61		demontáž T101	30 dní	Št 11.2.27	Str 24.3.27
62		Demontáž L101	30 dní	Št 11.2.27	Str 24.3.27
63		Repasáž nn obvodov T101	60 dní	Št 25.3.27	Str 16.6.27
64		vybudovanie nových základov a káblových kanálov v poliach AEA01, AEA03	60 dní	Št 22.4.27	Str 14.7.27
65		inštalácia novej technológie	60 dní	Št 15.7.27	Str 6.10.27
66		Výstavba nového stanovišťa T101+T21	60 dní	Št 22.4.27	Str 14.7.27
67		Inštalácia repasovaného T101	30 dní	Št 15.7.27	Str 25.8.27
68		inštalácia L21 (L101)	30 dní	Št 15.7.27	Str 25.8.27
69		Skúšky v poliach AEA01, AEA03	20 dní	Št 16.12.27	Str 12.1.28
70		Spustenie poli AEA01, AEA03	0 dní	Str 12.1.28	Str 12.1.28
71		Odstavenie poli AEA02, AEA04	0 dní	Str 12.1.28	Str 12.1.28
72		**PS10 - R22kV**	**250 dní**	**Ut 1.12.26**	**Po 15.11.27**
73		Preloženie a spojkovanie vedení V1351 a V1354	10 dní	Ut 1.12.26	Po 14.12.26
74		Demontáž sekcie A (nepárne polia - T101)	60 dní	Ut 15.12.26	Po 8.3.27
75		Osadenie nového rozvádzača R22kv	60 dní	Ut 4.5.27	Po 26.7.27
76		Preústenie vedení zo sekcie B	10 dní	Ut 27.7.27	Po 9.8.27
77		Skúšky R22kV	10 dní	Ut 10.8.27	Po 23.8.27
78		Demotáž sekcie B (párne polia - T102)	60 dní	Ut 24.8.27	Po 15.11.27
79		**PS30 - RIS**	**60 dní**	**Št 11.2.27**	**Str 5.5.27**
80		Inštalácia zariadení RIS	60 dní	Št 11.2.27	Str 5.5.27
81		**PS60 - ASDR**	**60 dní**	**Št 11.2.27**	**Str 5.5.27**
82		Inštalácia zariadení ASDR	60 dní	Št 11.2.27	Str 5.5.27
83		**PS31 - Ochrany**	**60 dní**	**Ut 1.12.26**	**Po 22.2.27**
84		Demontáž 1-3DE6 a 3-5 DE7	20 dní	Ut 1.12.26	Po 28.12.26
85		Montáž AWB01-AWB04	40 dní	Ut 29.12.26	Po 22.2.27
86		Montáž AWL	40 dní	Ut 29.12.26	Po 22.2.27
87		Pripojenie novej technológie			
88		**PS50 - Vlastná spotreba**	**175 dní**	**Ut 1.12.26**	**Po 2.8.27**
89		Výstavba baterkárne	30 dní	Ut 1.12.26	Po 11.1.27
90		vybudovanie nových stanovíšť pre T21, T22	30 dní	Ut 1.12.26	Po 11.1.27
91		Osadenie novej VS	30 dní	Ut 22.6.27	Po 2.8.27
92		**PS70, PS73 - Meranie elektrickej energie**	**302 dní**	**Ut 1.12.26**	**Str 26.1.28**
93		Prepájanie v rámci starej technológie	120 dní	Ut 1.12.26	Po 17.5.27
94		Odstránenie uvoľnených rozvádzačov	100 dní	Ut 29.12.26	Po 17.5.27
95		Montáž nových rozvádzačov	120 dní	Ut 12.1.27	Po 28.6.27
96		prepojenie do nových rozvádzačov	80 dní	Št 26.8.27	Str 15.12.27
97		Odstránenie zvyšku starej technológie	30 dní	Št 16.12.27	Str 26.1.28
98		Ukončenie 1. etapy	0 dní	Str 26.1.28	Str 26.1.28
99		**2. Etapa - kompletizácia**	**230 dní?**	**Str 26.1.28**	**Str 13.12.28**
100		Zahájenie 2.etapy	0 dní	Str 26.1.28	Str 26.1.28
101		**SO34 - BSP**	**32 dní?**	**Št 27.1.28**	**Pi 10.3.28**
102		Presun obsluhy do zrekonštruovaných priestorov	10 dní	Št 27.1.28	Str 9.2.28
103		odstránenie Dupronitových priečok	10 dní	Št 10.2.28	Str 23.2.28
104		vybudovanie nových priečok	10 dní	Št 24.2.28	Str 8.3.28
105		Podopretie transportného koridoru	1 deň?	Št 9.3.28	Št 9.3.28
106		Navezenie rozvádzačov R22kV	1 deň?	Pi 10.3.28	Pi 10.3.28
107		**SO49 - Demolácie**	**20 dní**	**Št 9.3.28**	**Str 5.4.28**
108		Základové pätky	20 dní	Št 9.3.28	Str 5.4.28
109		KK	20 dní	Št 9.3.28	Str 5.4.28
110		Bezpečnostné zábradlia	20 dní	Št 9.3.28	Str 5.4.28
111		Betónové plochy	20 dní	Št 9.3.28	Str 5.4.28
112		Stanovište transformátora	20 dní	Št 9.3.28	Str 5.4.28
113		Stanovište tlmiviek	20 dní	Št 9.3.28	Str 5.4.28
114		Oplotenia , múry, brány vrátane základov	20 dní	Št 9.3.28	Str 5.4.28
115		Šachty, chodníky , obrubníky	20 dní	Št 9.3.28	Str 5.4.28
116		Demontáž lámp	20 dní	Št 9.3.28	Str 5.4.28
117		Asfaltové a betónové komunikácie + frézovanie	20 dní	Št 9.3.28	Str 5.4.28
118		Žumpa	10 dní	Št 9.3.28	Str 22.3.28
119		**PS04, PS06, PS09**	**230 dní**	**Str 26.1.28**	**Str 13.12.28**
120		Prevádzka R110kV cez polia AEA01, AEA03	0 dní	Str 26.1.28	Str 26.1.28
121		demontáž technológie v poli AEA02, AEA04	30 dní	Št 27.1.28	Str 8.3.28
122		demontáž T102	30 dní	Št 27.1.28	Str 8.3.28
123		Demontáž L102	30 dní	Št 27.1.28	Str 8.3.28
124		Repasáž nn obvodov T102	30 dní	Št 9.3.28	Str 19.4.28
125		vybudovanie nových základov a káblových kanálov v poliach AEA02, AEA04	60 dní	Št 6.4.28	Str 28.6.28
126		inštalácia novej technológie	60 dní	Št 29.6.28	Str 20.9.28
127		Inštalácia repasovaného T102	30 dní	Št 29.6.28	Str 9.8.28
128		inštalácia L22 (L102)	30 dní	Št 29.6.28	Str 9.8.28
129		Vybudovanie priečnej spojky	30 dní	Št 6.4.28	Str 17.5.28
130		Skúšky v poliach AEA02, AEA04	40 dní	Št 19.10.28	Str 13.12.28
131		Spustenie poli AEA02, AEA04	0 dní	Str 13.12.28	Str 13.12.28
132		**PS10 - R22kV**	**158 dní**	**Po 13.3.28**	**Str 18.10.28**
133		Osadenie nového rozvádzača R22kv - sekcia B	30 dní	Po 13.3.28	Pi 21.4.28
134		Preústenie vedení do sekcie B - konečné zapojenie	30 dní	Št 10.8.28	Str 20.9.28
135		Skúšky R22kV	20 dní	Št 21.9.28	Str 18.10.28
136		**PS30 - RIS**	**45 dní**	**Št 29.6.28**	**Str 30.8.28**
137		Inštalácia zariadení RIS	45 dní	Št 29.6.28	Str 30.8.28
138		**PS60 - ASDR**	**45 dní**	**Št 29.6.28**	**Str 30.8.28**
139		Inštalácia zariadení ASDR	45 dní	Št 29.6.28	Str 30.8.28
140		**PS31 - Ochrany**	**30 dní**	**Št 27.1.28**	**Str 8.3.28**

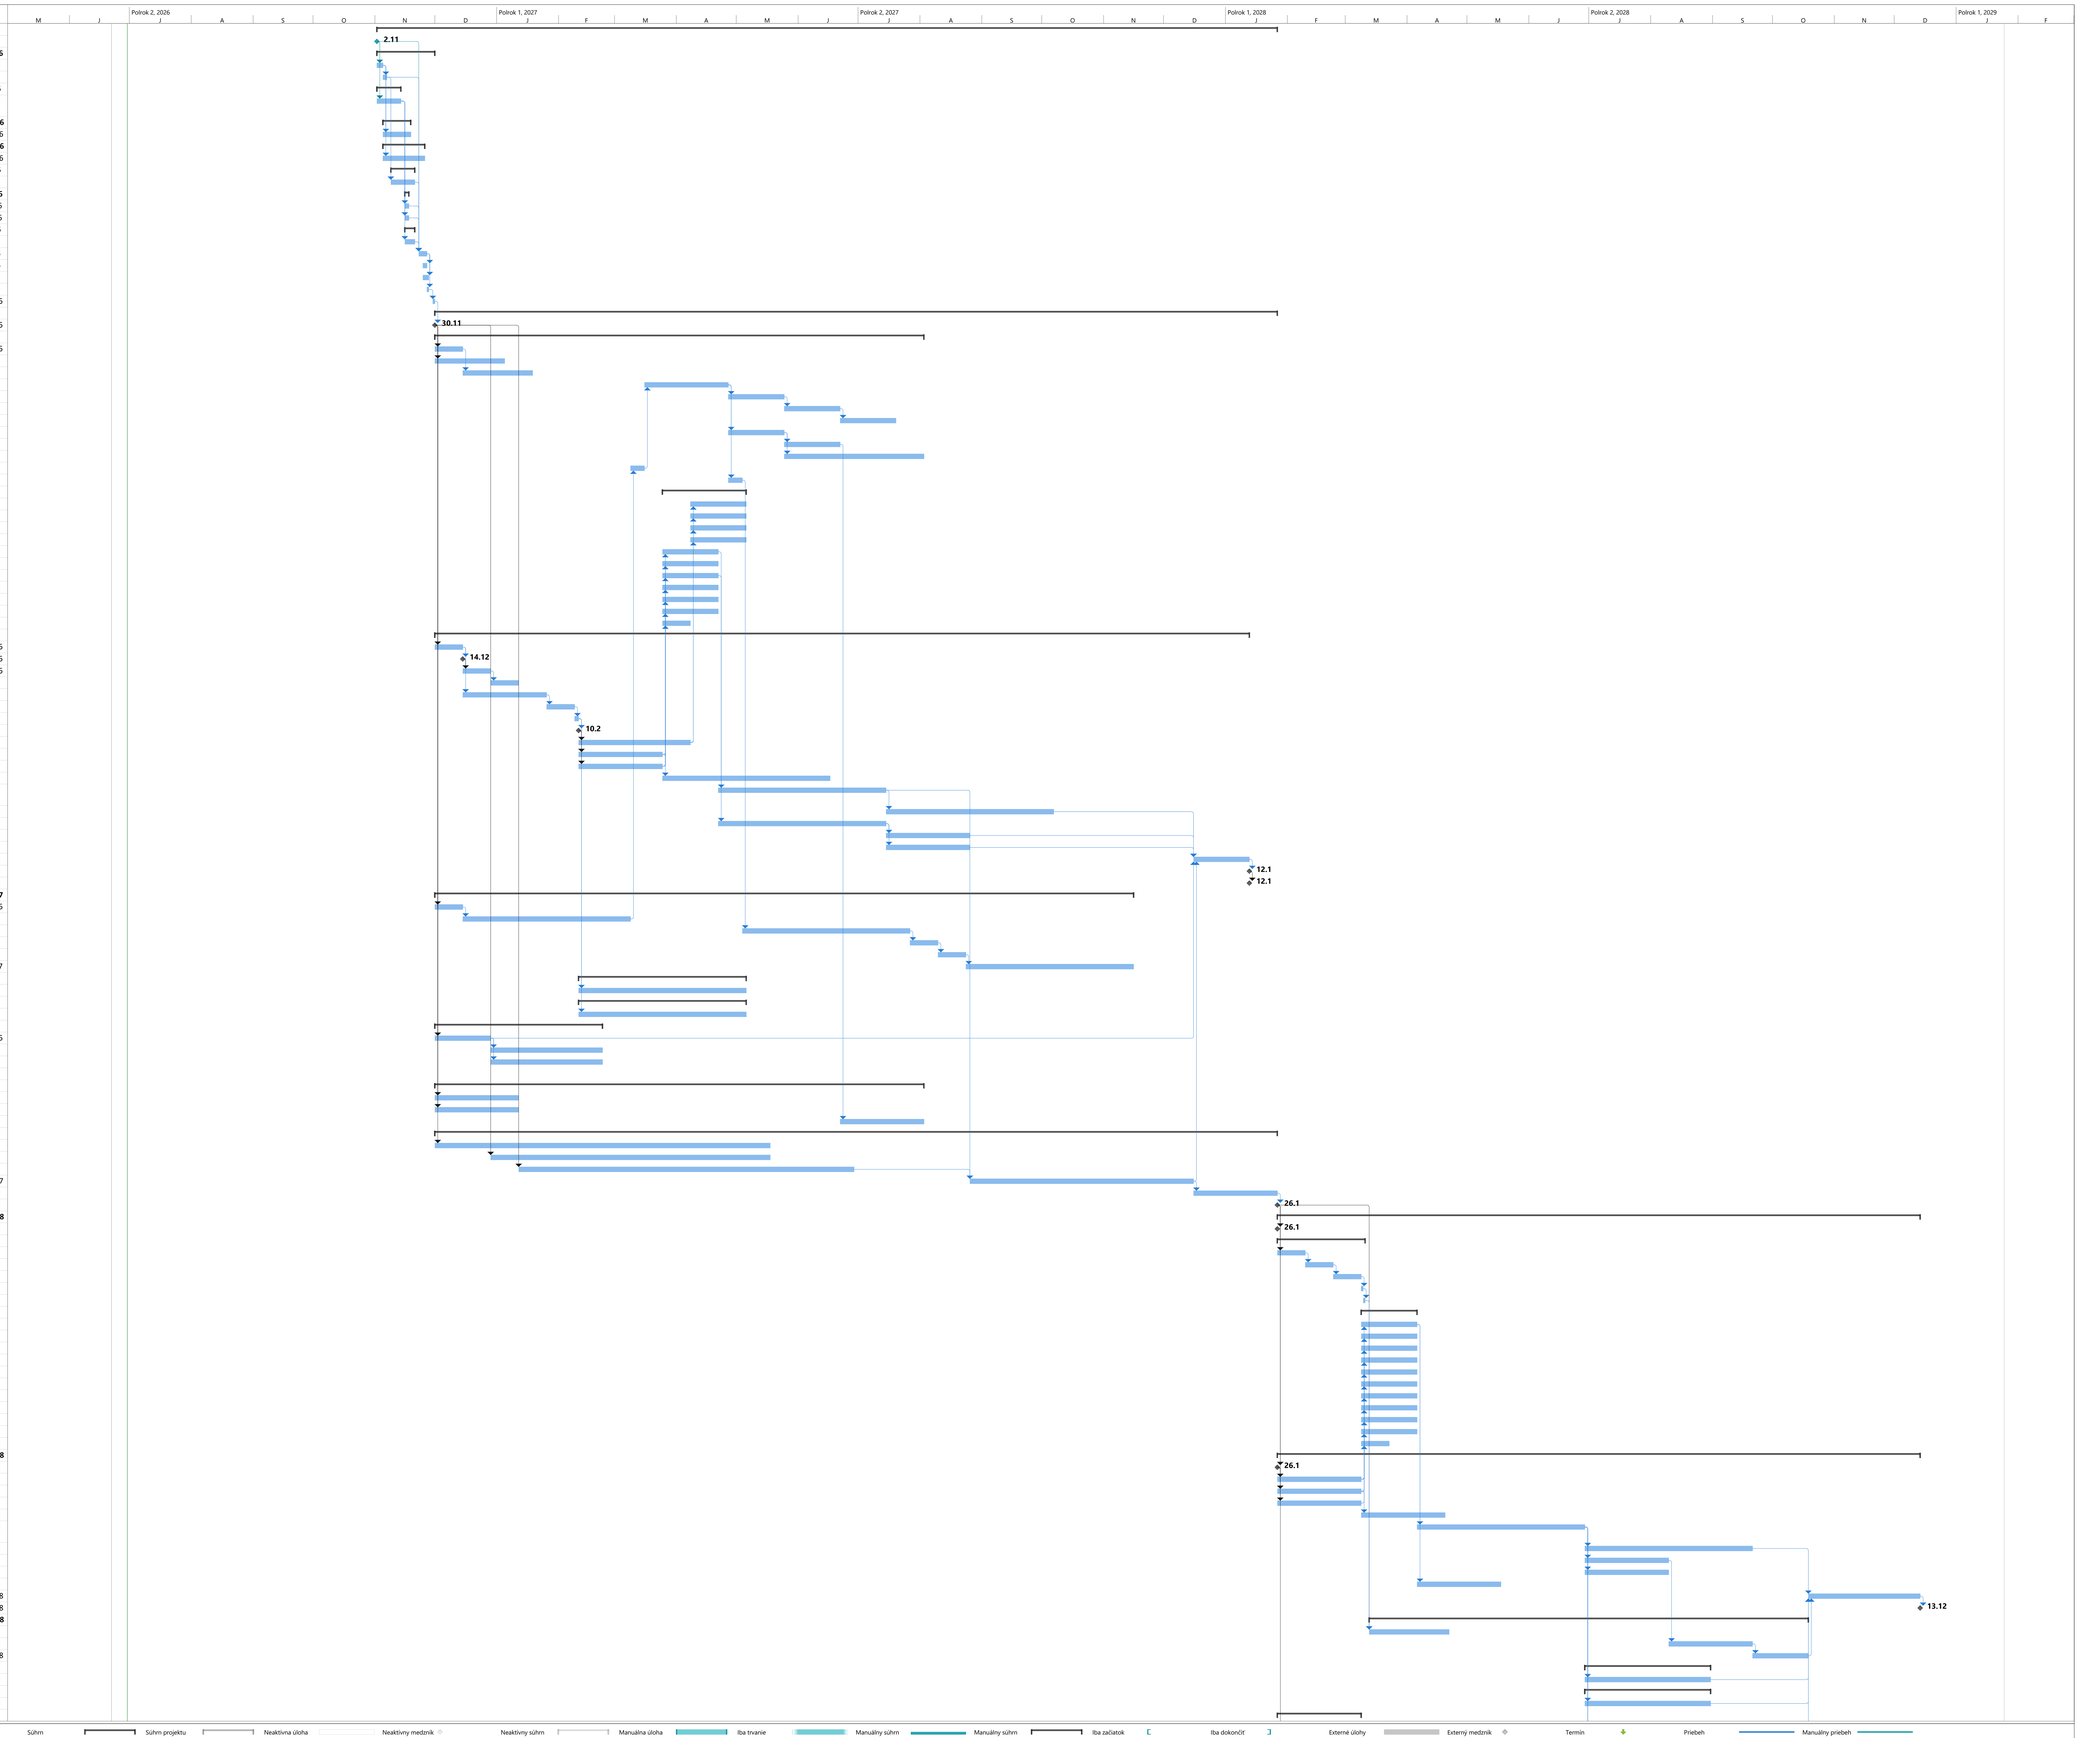

TRIAL MODE. Click here for more information

Identifikátor	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
141		Montáž AWB01-AWB04	30 dní	Št 27.1.28	Str 8.3.28
142		Montáž AWL	30 dní	Št 27.1.28	Str 8.3.28
143		**PS50 - Vlastná spotreba**	**80 dní**	**Št 29.6.28**	**Str 18.10.28**
144		Pripojenie nových častí do novej VS	70 dní	Št 29.6.28	Str 4.10.28
145		Demontáž starej VS	10 dní	Št 5.10.28	Str 18.10.28
146		***PS70, PS73 - Meranie elektrickej energie***	**70 dní**	**Št 29.6.28**	**Str 4.10.28**
147		prepojenie do nových rozvádzačov	70 dní	Št 29.6.28	Str 4.10.28
148		Ukončenie 2. etapy	0 dní	Str 4.10.28	Str 4.10.28
149		**Porealizačná etapa**	**80 dní**	**Št 5.10.28**	**Str 24.1.29**
150		Uvedenie do prevádzky	20 dní	Št 5.10.28	Str 1.11.28
151		Odovzdanie stavby	20 dní	Št 5.10.28	Str 1.11.28
152		Zrušenie zaraidenia staveniska	10 dní	Št 2.11.28	Str 15.11.28
153		Kolaudácia	60 dní	Št 2.11.28	Str 24.1.29
154		koniec projektu	0 dní	Str 24.1.29	Str 24.1.29

Projekt: HMG_ES Nižná PM1
Dátum: Ut 30.6.26

Úloha | Rozdeliť | Medzník | Súhrn | Súhrn projektu | Neaktívna úloha | Neaktívny medzník | Neaktívny súhrn | Manuálna úloha | Iba trvanie | Manuálny súhrn | Manuálny súhrn | Iba začiatok | Iba dokončiť | Externé úlohy | Externý medzník | Termín | Priebeh | Manuálny priebeh
